

Svenska Kyrkan Orust pastorat

Göteborg 2022-05-06

Beträffande projekt: Hälleviksstrands kyrka Etapp 2 2021/2022

Lägesrapport nr 3 2022-05-06

Här kommer en enkel lägesrapport om vad som händer för närvarande i projektet.

För närvarande pågår takarbete i form av omläggning av skiffer och tillhörande plåtar.

Det går som planerat och förväntas bli klart inom de närmaste veckorna.

Därefter byggs ställning om för att fortsätta med resterande målning av fasad.

Vi har även fått besked från konstruktör att förstärkningsarbetet av dragjärn behöver göras.


Det är ett arbete som behöver planeras och utföras före vintern. Vi pratar om det på nästa möte.

Vi har även fått klartecken från konstruktör att byte av rötskadat timmer kan utföras utan vidare förstärkningsarbete. Detta arbete kommer påbörjas inom de närmaste veckorna.

Arbetet i sin helhet följer tidplan och om inget oförberett händer är vi klara still midsommar.

Klipper in lite bilder nedan:



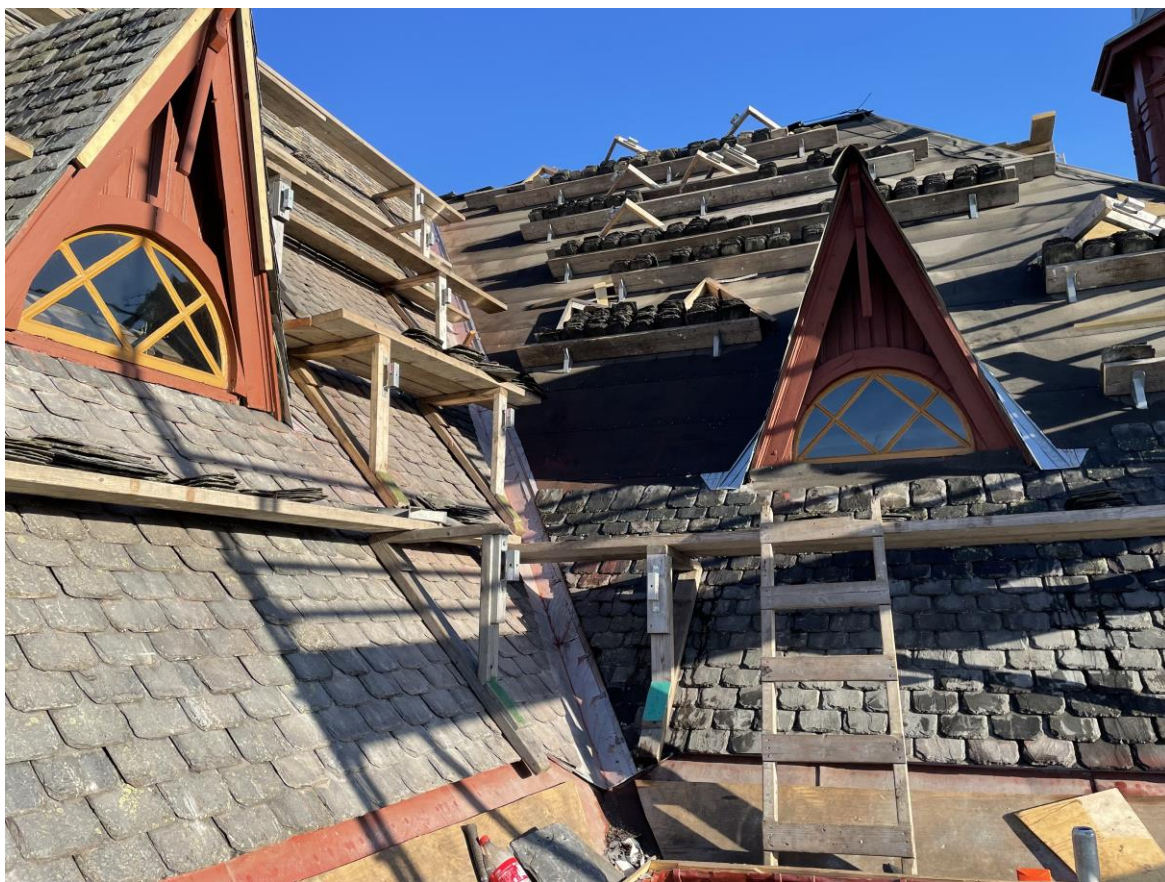



Med vänlig hälsning

ByggRex i Väst AB

Mats Olofsson
